Mesure des retombées de poussières autour de la décharge de la Courte-Queue à Boécourt

Note : Le point P-Air3 est situé dans la décharge et n'est pas soumis aux valeurs d'immission O-pair. Il s'agit d'un point de contrôle interne

N° Capteur		P-Air 1 (ouest)				P-Air 2 (sud-ouest)				P-Air 4 (nord-est)				P-Air 5 (nord-cabanne forestière)			
Paramètres		**Poussières**	**Plomb**	**Zinc**	**Cadmium**	**Poussières**	**Plomb**	**Zinc**	**Cadmium**	**Poussières**	**Plomb**	**Zinc**	**Cadmium**	**Poussières**	**Plomb**	**Zinc**	**Cadmium**
Unité de mesure		mg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	mg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	mg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	mg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j	µg/m²/j
Valeur limite immission OPair		**200**	**100**	**400**	**2**	**200**	**100**	**400**	**2**	**200**	**100**	**400**	**2**	**200**	**100**	**400**	**2**
01.09.2025	06.10.2025	48	4	38	0.70	86	13	103	0.15	132	66	459	0.94	116	48	322	0.77
06.10.2025	03.11.2025	15	3	18	0.05	93	8	52	0.08	97	47	335	0.63	63	23	180	0.29
03.11.2025	04.12.2025	23	2	14	0.03	51	16	113	0.17	84	34	246	0.53	61	29	191	0.35
04.12.2025	06.01.2026	10	3	19	0.05	31	19	92	0.27	158	55	401	0.79	29	19	110	0.25
06.01.2026	04.02.2026	10	5	30	0.06	47	22	126	0.19	113	39	341	0.73	53	32	208	0.43
04.02.2026	03.03.2026	30	2	15	0.04	62	11	82	0.17	104	25	211	0.37	74	32	201	0.31
03.03.2026	01.04.2026	47	3	59	0.05	89	24	197	0.22	158	58	370	0.63	119	48	324	0.51
01.04.2026	04.05.2026	71	4	29	0.05	130	24	148	0.26	129	21	142	0.23	Déterioré	50	297	0.53
04.05.2026	03.06.2026	95	2	24	0.04	91	14	96	0.16	179	50	371	0.60	94	29	181	0.27
03.06.2026	06.07.2026	117	1	24	0.03	83	15	97	0.13	167	43	306	0.57	111	41	268	0.42
06.07.2026	11.08.2026	58	2	17	0.04	89	12	96	0.17	110	25	179	0.32	93	28	186	0.29
11.08.2026	03.09.2026	76	4	31	0.06	87	12	68	0.09	193	93	596	1.01	187	70	506	0.77
Moyenne annuelle Calculée en fonction du nombre de jours		50	3	26	0.11	78	16	107	0.17	134	45	323	0.60	79	37	243	0.43

SEOD
SYNDICAT DE GESTION DES DÉCHETS DE DELÉMONT ET ENVIRONS

Commune de Boécourt

Décharge de "La Courte Queue"

Extension de la décharge

SURVEILLANCE

TRAITEMENT DES MACHEFERS

Concept de surveillance des retombées de poussières

Situation

CSDINGENIEURS+

CSD INGENIEURS SA
Rue de la Jeunesse 1
CH - 2800 Delémont
Tél +41 32 465 50 30
delemont@csd.ch / www.csd.ch

PLAN N°	ECHELLE
JU00888.322.62-01	1:2500

Date	Dessiné	Contrôlé
03.06.2022	ARY	PFI
Format A3		

Modif.	Date	Dessiné	Contrôlé	Modif.	Date	Dessiné	Contrôlé
A	26.08.2022	ARY	PFI	D	07.11.2024	ARY	PFI
B	18.09.2023	ARY	PFI	E	-	-	-
C	06.02.2024	ARY	PFI	F	-	-	-

O:\JU\dwg\JU00888.322\JU00888.322.62-01c Stations mesure retombées poussières.dwg

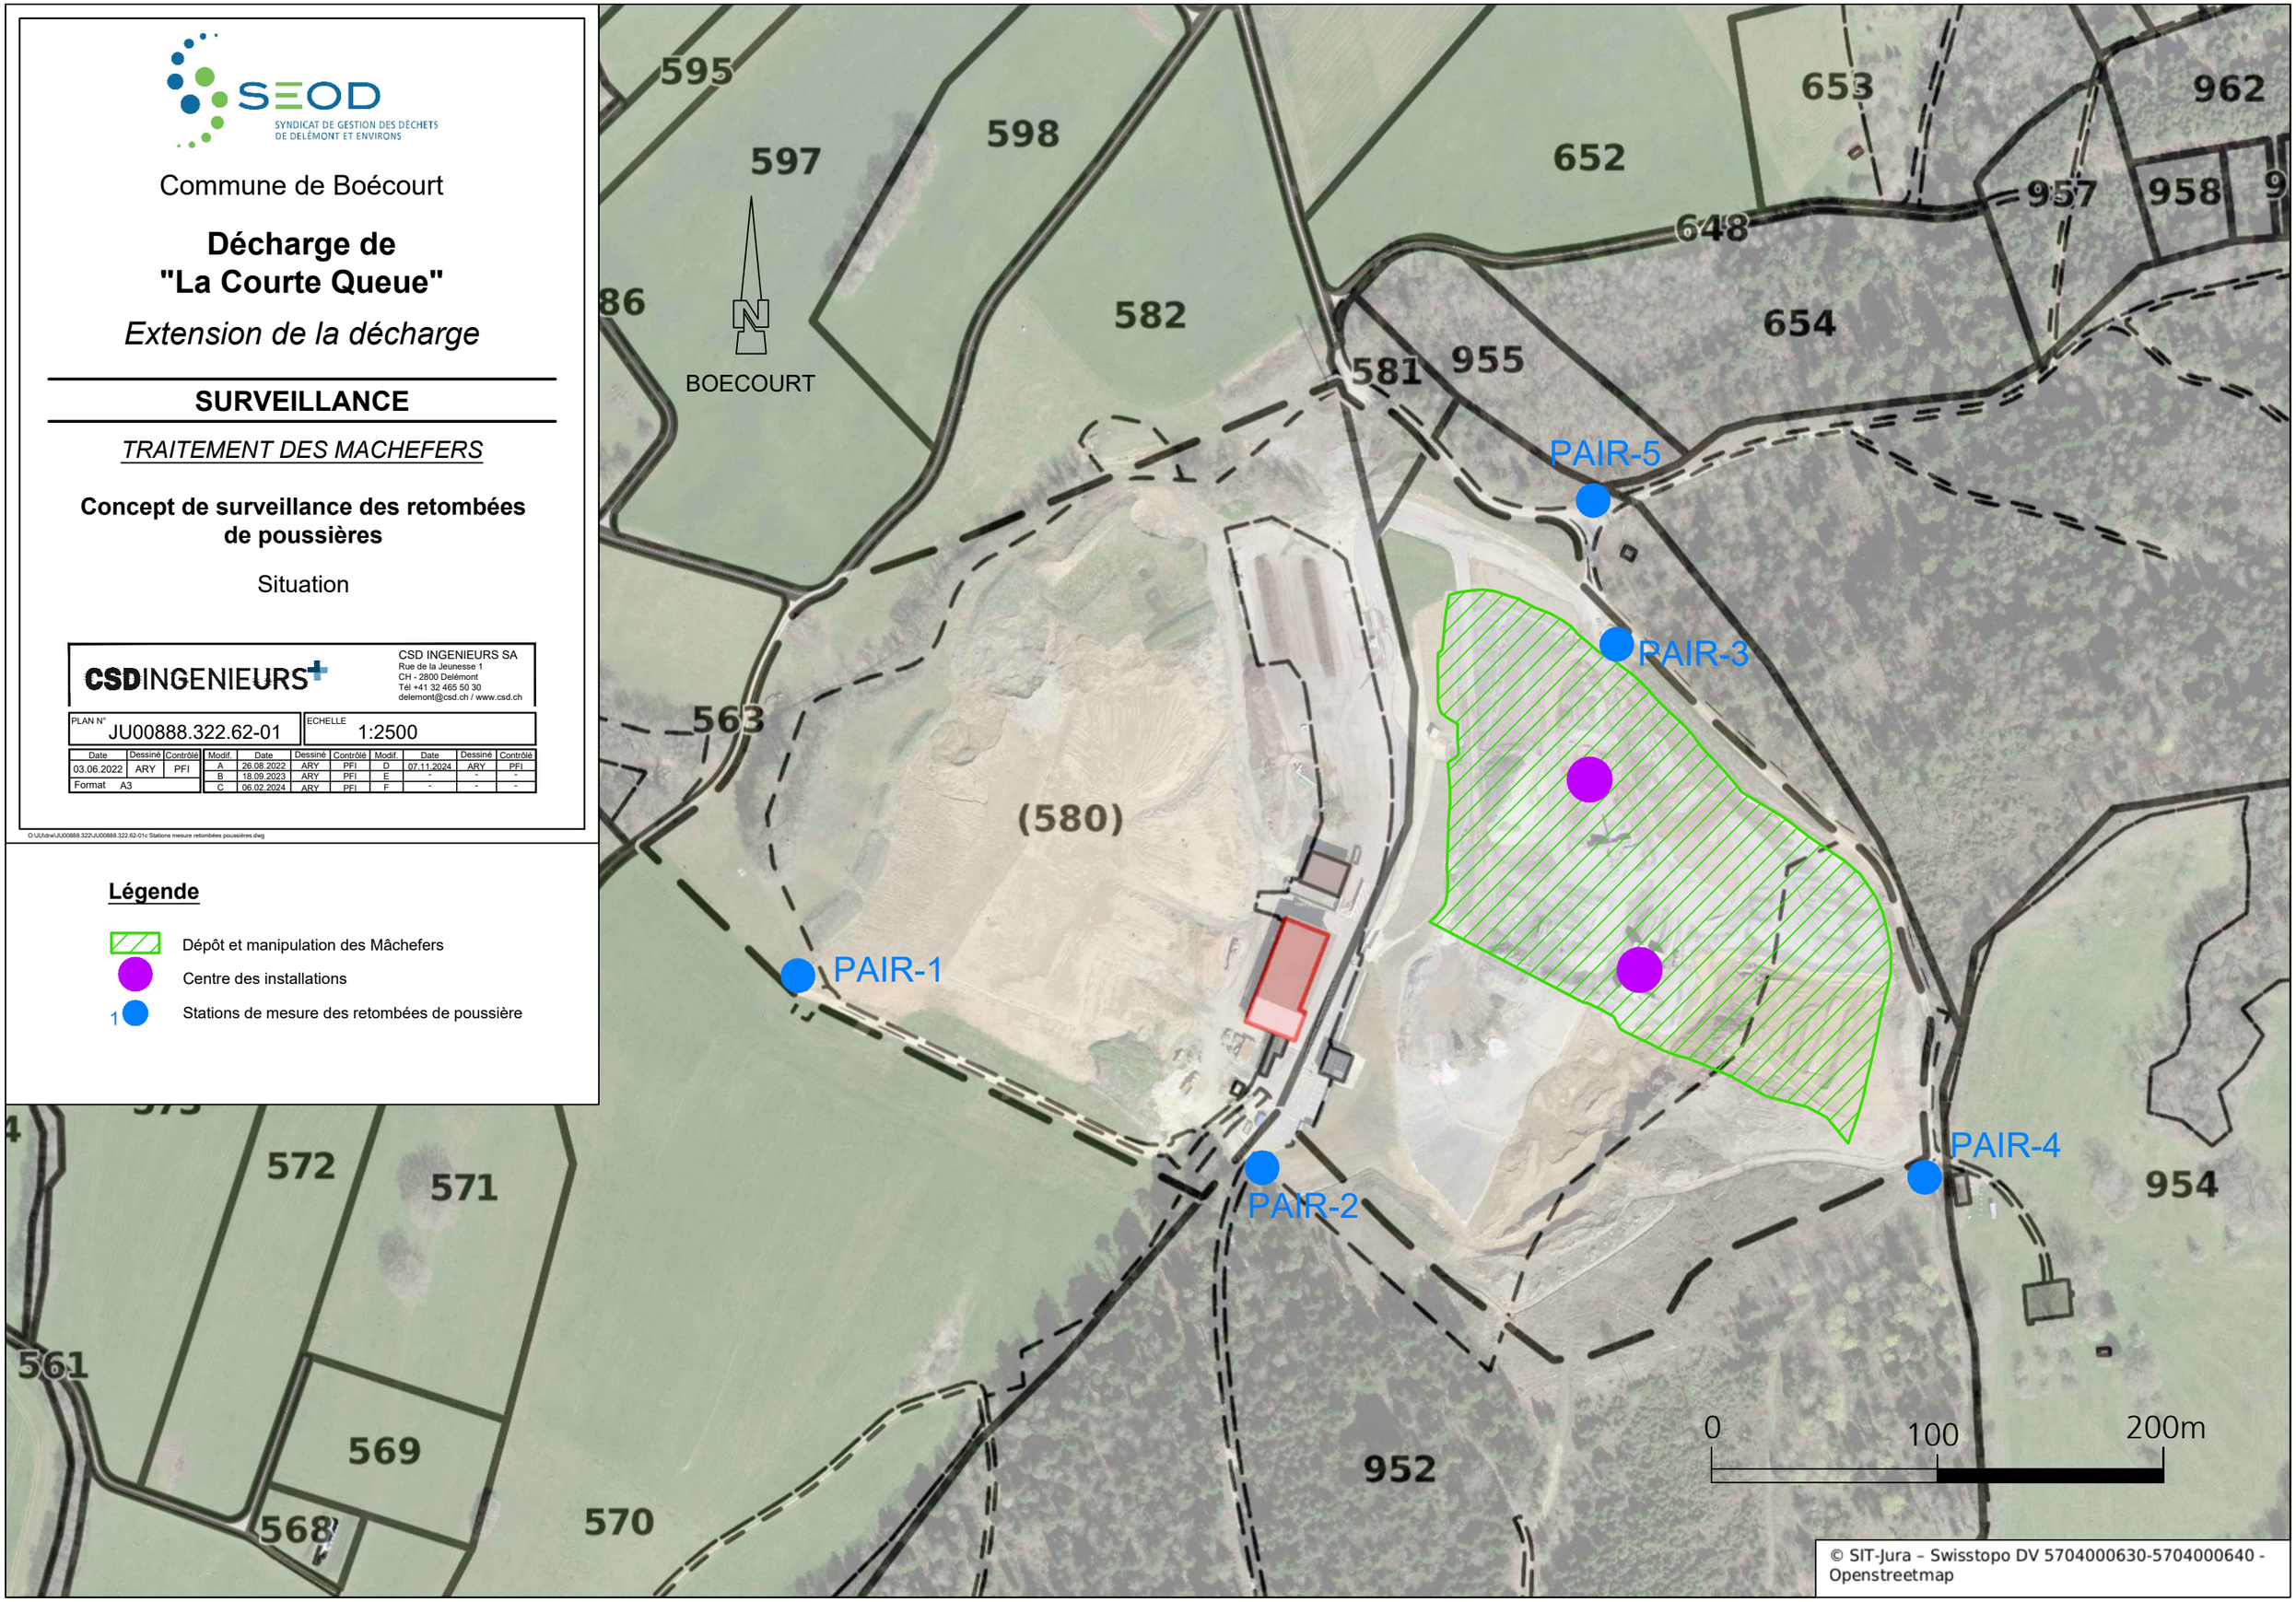

Légende

- Dépôt et manipulation des Mâchefers
- Centre des installations
- 1 Stations de mesure des retombées de poussière
